5.08.39008, SI2146, Neubau der Donaubrücke Wörth - Pfatter, Bauzeitenplan

Nr.	Vorgang/Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	SI 2146, Neubau der Donaubrücke Wörth - Pfatter	0 Tage		
2	Vorgabe: Mahd Juni / Juli 2023			
3	Bauvorgang	0 Tage		
4	Erstellen Ausführungsunterlagen, Vorlauf, Planung	60 Tage		
5	Verkehrsfreiheit, regelmäßige Mähen	75 Tage		
6	Baufeldsicherung, Oberboden/ebenen, Einrichtung Baustellen, Zuwegung Baustellenerschließung	20 Tage		
7	**Herstellung Bauwerk in Seitenlage**	**565 Tage**		
8	**Gründung und Betonfundamentbauten**	**80 Tage**		
9	**Pfeiler Achse 40**	**45 Tage**		
10	Herstellung Bohrpfähle	10 Tage		
11	Verbau, Baugrubensaushub, Unterwasserbeton, Pfähle herrichten	10 Tage		
12	Herstellung Pfahlkopfplatte	10 Tage		
13	Herstellung Pfeiler	15 Tage		
14	**Pfeiler Achse 30**	**38 Tage**		
15	Herstellung Bohrpfähle	6 Tage		
16	Verbau, Baugrubensaushub, Pfähle herrichten	7 Tage		
17	Herstellung Pfahlkopfplatte	10 Tage		
18	Herstellung Pfeiler	15 Tage		
19	**Pfeiler Achse 20**	**38 Tage**		
20	Herstellung Bohrpfähle	6 Tage		
21	Verbau, Baugrubensaushub, Pfähle herrichten	7 Tage		
22	Herstellung Pfahlkopfplatte	10 Tage		
23	Herstellung Pfeiler	15 Tage		
24	**Widerlager Achse 10**	**40 Tage**		
25	Herstellung Bohrpfähle	5 Tage		
26	Verbau, Baugrubensaushub, Pfähle herrichten	5 Tage		
27	Herstellung Pfahlkopfplatte	10 Tage		
28	Herstellung Widerlager	20 Tage		
29	**Pfeiler Achse 50**	**46 Tage**		
30	Umsetzung Bohrgerät	1 Tag		
31	Herstellung Bohrpfähle	10 Tage		
32	Verbau, Baugrubensaushub, Unterwasserbeton, Pfähle herrichten	10 Tage		
33	Herstellung Pfahlkopfplatte	10 Tage		
34	Herstellung Pfeiler	15 Tage		
35	**Pfeiler Achse 60**	**40 Tage**		
36	Herstellung Bohrpfähle	6 Tage		
37	Verbau, Baugrubensaushub, Pfähle herrichten	7 Tage		
38	Herstellung Pfahlkopfplatte	10 Tage		
39	Herstellung Pfeiler	15 Tage		
40	**Widerlager Achse 70**	**42 Tage**		
41	Herstellung Bohrpfähle	7 Tage		
42	Verbau, Baugrubensaushub, Pfähle herrichten	5 Tage		
43	Herstellung Pfahlkopfplatte	10 Tage		
44	Herstellung Widerlager	20 Tage		
45	**Überbau**	**520 Tage**		
46	**Überbau, Freivorbau Achse 40**	**190 Tage**		
47	Pfeilertisch	15 Tage		
48	Freivorbau	175 Tage		
49	**Überbau, Freivorbau Achse 50**	**190 Tage**		
50	Pfeilertisch	15 Tage		
51	Freivorbau	175 Tage		
52	**Lückenschluss 40 - 50**	**15 Tage**		
53	Lückenschluss	15 Tage		
54	**Überbau, Traggerüst Achse 10 - 40**	**110 Tage**		
55	Traggerüst aufbauen	15 Tage		
56	Bewehrung und Betonage Überbau	30 Tage		
57	Vorspannung, Aushärtung	10 Tage		
58	Umbau Traggerüst	15 Tage		
59	Bewehrung und Betonage Überbau	30 Tage		
60	Vorspannung, Aushärtung	10 Tage		
61	**Überbau, Traggerüst Achse 60 - 70**	**55 Tage**		
62	Traggerüst aufbauen	15 Tage		
63	Bewehrung und Betonage Überbau	30 Tage		
64	Vorspannung, Aushärtung	10 Tage		
65	**Ausbau Überbau**	**110 Tage**		
66	Einbau provisorische Entwässerung	15 Tage		
67	Einbau endgültige Lager	20 Tage		
68	Externe Vorspannung	30 Tage		
69	Widerlager, hintere Kammerwände	10 Tage		
70	Ausgleichsgradiente, Abdichtung, Kappen, Belag	40 Tage		
71	Geländer, Schutzeinrichtungen, Straßenanbindungen	30 Tage		
72	**Verkehrsumlegung**	**0 Tage**		
73	**Abbruch Bestandsbauwerk**	**135 Tage**		
74	**Phase 0**	**40 Tage**		
75	Vorabmaßnahme: Leichtem Überbau, Verstärkungen	40 Tage		
76	**Phase 1**	**20 Tage**		
77	Einbau Lückenfeder mit Aufhängekonstruktion	15 Tage		
78	Trennschnitt, Abtassen, Abschwimmen Fluss/Feld II	5 Tage		
79	**Phase 2**	**25 Tage**		
80	Flussegmente 10 und 18 (Parallel)	5 Tage		
81	Einbau Lückenfeder mit Aufhängekonstruktion	10 Tage		
82	Trennschnitt, Abtassen, Abtransport Feld I - II und III	10 Tage		
83	**Phase 3**	**20 Tage**		
84	Einbau Lückenfeder mit Aufhängekonstruktion	10 Tage		
85	Trennschnitt, Abtassen, Abtransport Feld 0 - I und IV	10 Tage		
86	Überbausegmente 8 und 19/20 (Parallel), Pfeiler II	20 Tage		
87	**Phase 4**	**20 Tage**		
88	Einbau Lückenfeder mit Aufhängekonstruktion	10 Tage		
89	Trennschnitt, Abtassen, Abtransport Feld V - VI	10 Tage		
90	Überbausegmente 1, 4 und 24 (Parallel), Pfeiler I und IV, Widerlager 0	20 Tage		
91	**Phase 5**	**20 Tage**		
92	Restarbeiten am Überbau, Pfeiler V und Widerlager II	20 Tage		
93	**Herstellung Bauwerk in Endlage**	**135 Tage**		
94	**Gründung und Unterbauten**	**135 Tage**		
95	**Widerlager Achse 10**	**30 Tage**		
96	Herstellung Bohrpfähle	5 Tage		
97	Verbau, Baugrubensaushub, Pfähle herrichten	5 Tage		
98	Herstellung Pfahlkopfplatte	10 Tage		
99	Herstellung Widerlager	30 Tage		
100	**Pfeiler Achse 20**	**30 Tage**		
101	Herstellung Bohrpfähle	6 Tage		
102	Verbau, Baugrubensaushub, Pfähle herrichten	7 Tage		
103	Herstellung Pfahlkopfplatte	10 Tage		
104	Herstellung Pfeiler	15 Tage		
105	**Pfeiler Achse 30**	**30 Tage**		
106	Herstellung Bohrpfähle	6 Tage		
107	Verbau, Baugrubensaushub, Unterwasserbeton, Pfähle herrichten	7 Tage		
108	Herstellung Pfahlkopfplatte	10 Tage		
109	Herstellung Pfeiler	15 Tage		
110	**Pfeiler Achse 40**	**50 Tage**		
111	Herstellung Bohrpfähle	10 Tage		
112	Verbau, Baugrubensaushub, Pfähle herrichten	10 Tage		
113	Herstellung Pfahlkopfplatte	10 Tage		
114	Herstellung Pfeiler	15 Tage		
115	**Widerlager Achse 70**	**53 Tage**		
116	Umsetzung Bohrgerät	1 Tag		
117	Herstellung Bohrpfähle	7 Tage		
118	Verbau, Baugrubensaushub, Pfähle herrichten	5 Tage		
119	Herstellung Pfahlkopfplatte	10 Tage		
120	Herstellung Widerlager	30 Tage		
121	**Pfeiler Achse 60**	**40 Tage**		
122	Herstellung Bohrpfähle	6 Tage		
123	Verbau, Baugrubensaushub, Pfähle herrichten	7 Tage		
124	Herstellung Pfahlkopfplatte	10 Tage		
125	Herstellung Pfeiler	15 Tage		
126	**Pfeiler Achse 50**	**45 Tage**		
127	Herstellung Bohrpfähle	10 Tage		
128	Verbau, Baugrubensaushub, Unterwasserbeton, Pfähle herrichten	10 Tage		
129	Herstellung Pfahlkopfplatte	10 Tage		
130	Herstellung Pfeiler	15 Tage		
131	**Beginn Vollsperrung**	**0 Tage**		
132	**Querverschub und Anbindung**	**50 Tage**		
133	Verbreiterung SV Querverschub (Freilegen FDK, Abbruch hintere Kammerwand, Arbeiten Überbau, Lager, etc.)	10 Tage		
134	Querverschub Überbau	5 Tage		
135	Einbau FDK, Lager, Aufdrücken	25 Tage		
136	Ergänzung Dichtung, Kappen, Kappen, SE, Geländer, Hinterfüllung, Straßenanbindung	20 Tage		
137		10 Tage		
138	**Ende Vollsperrung / Verkehrsumlegung**	**0 Tage**		
139	**Restarbeiten**	**85 Tage**		
140	Abbruch Behelfsunterbauten (Widerlager und Pfeiler) und Verschubbahnen	35 Tage		
141	Ergänzung der bestehenden Unterbauten	30 Tage		
142	Räumung Baufeld, Rückbau Baustraßen, Herrichten Gelände unter Bauwerken	20 Tage		

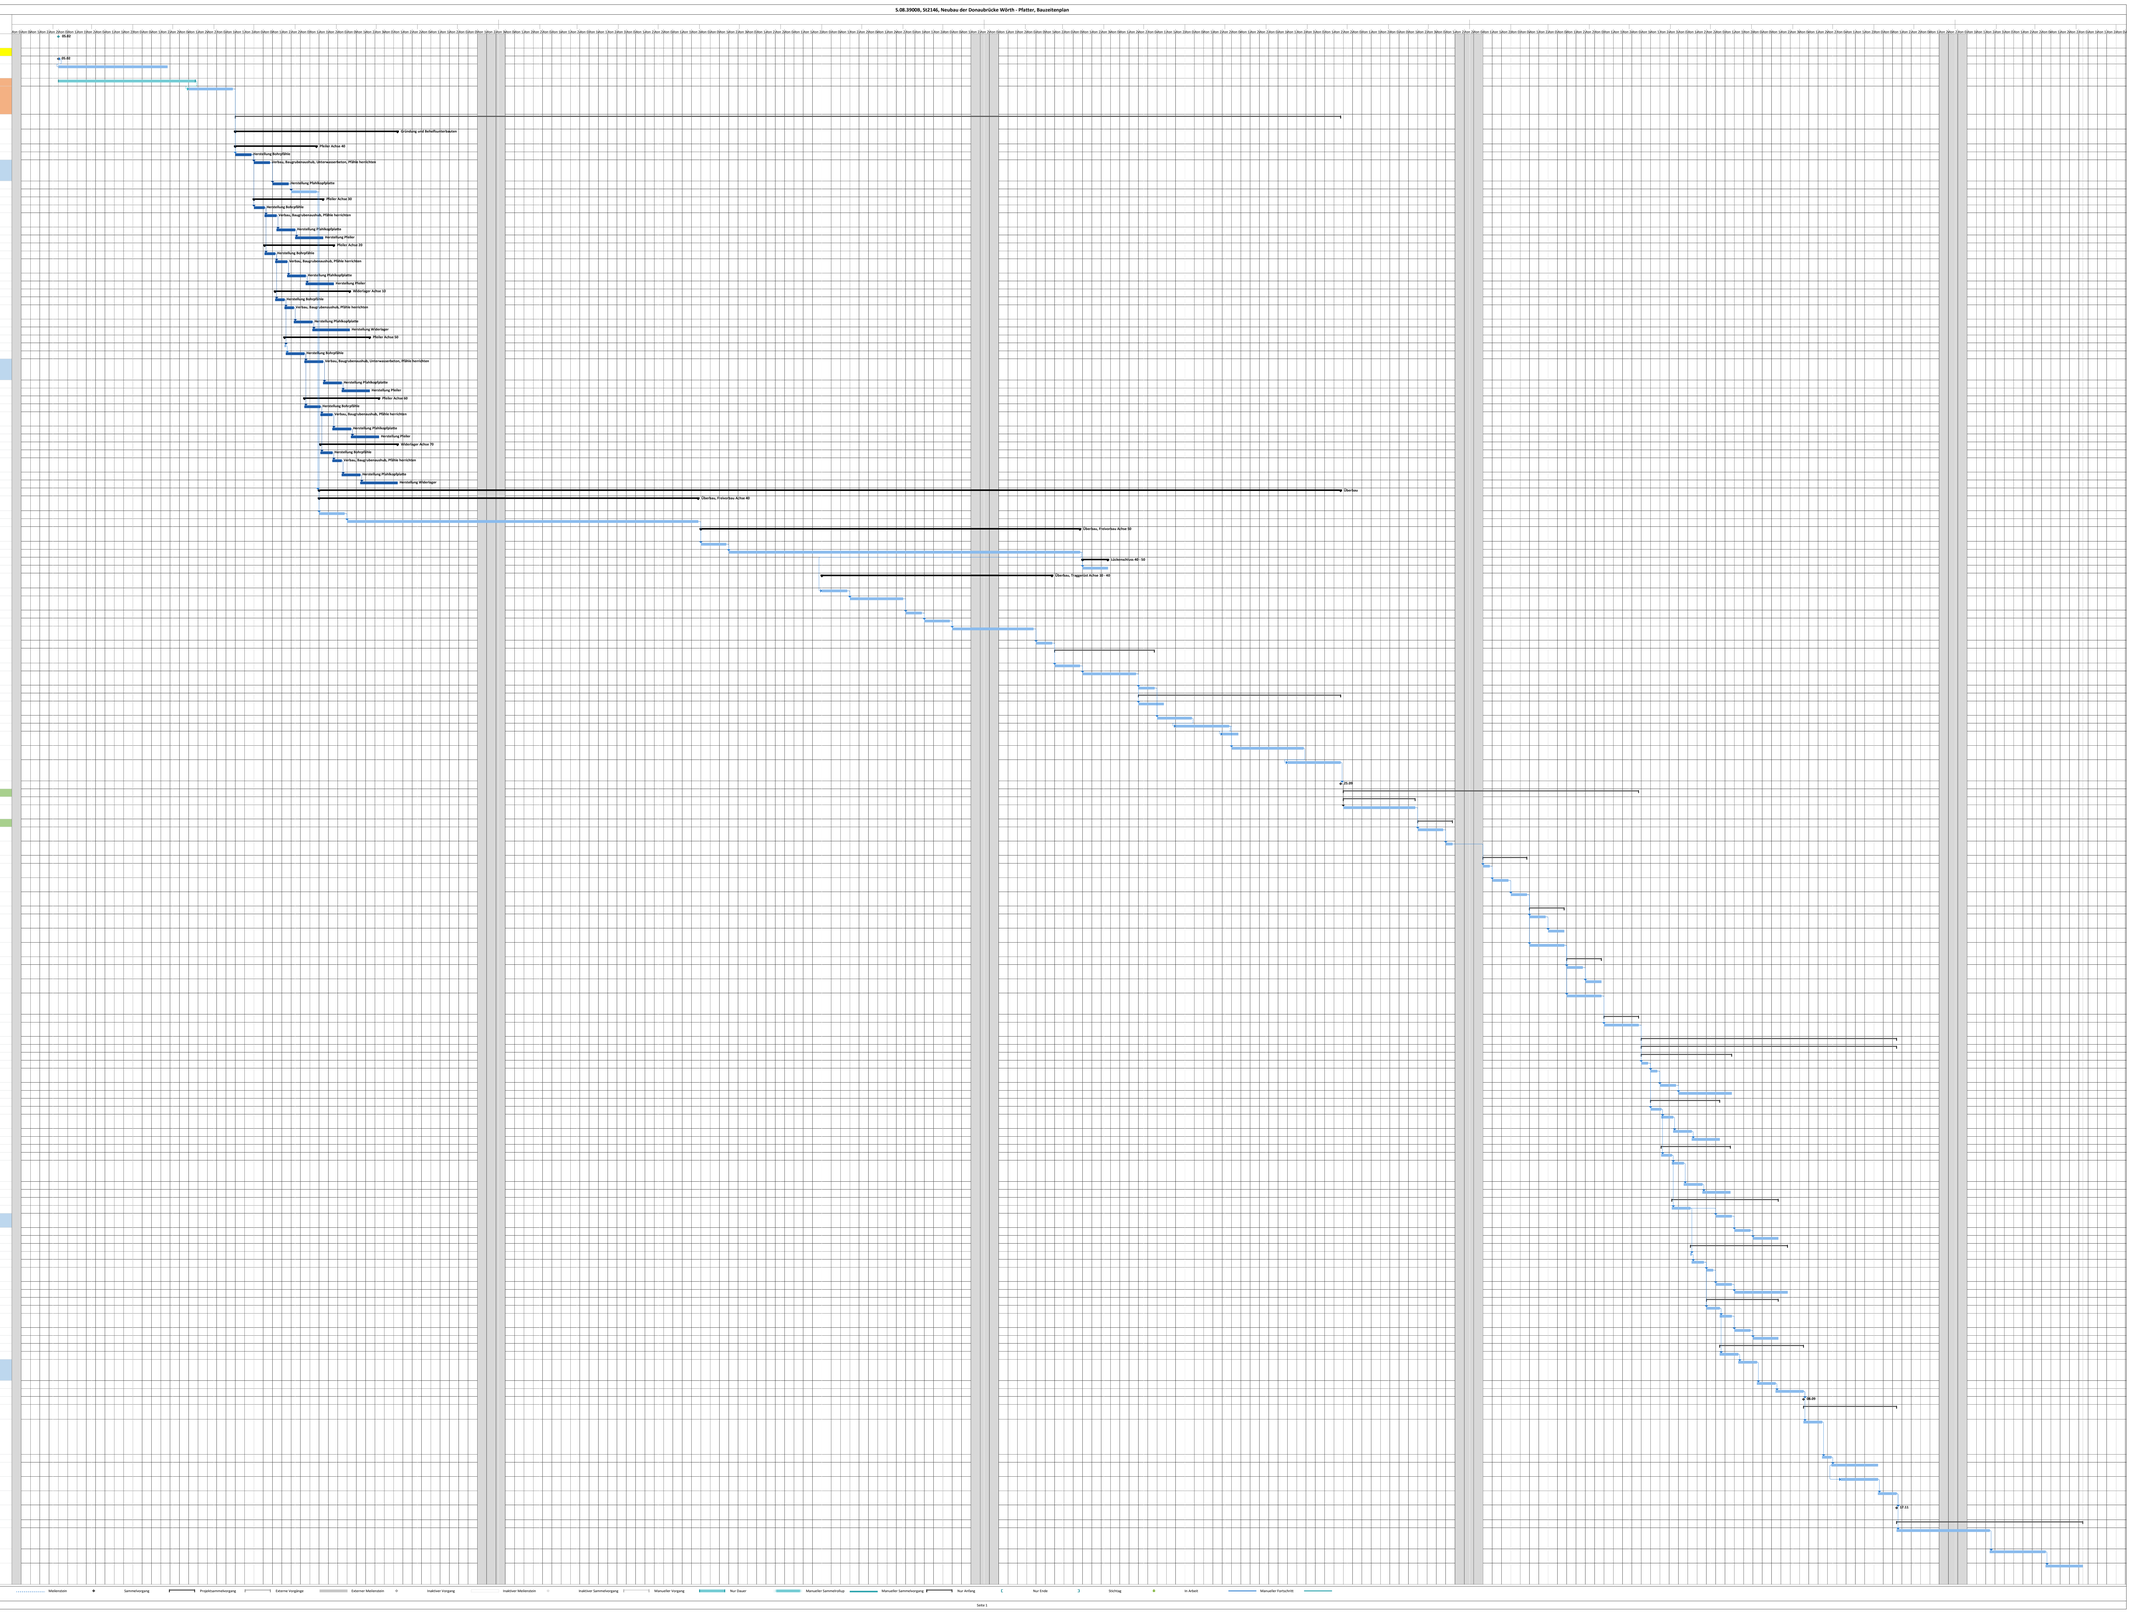

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt
